AS-BAU HOF GMBH

Baustelle: **AS71851 AWA Creußen, OT Lindenhardt** Startdatum: 1. Mai 2019

Auftraggeber: **Stadt Creußen**

Nr.		h
1	Baustelle einrichten / räumen	LH 926 C + 2 FA
2	Baustelle vorhalten	
3	Verkehrssicherung	Fa. B.A.S.
4	Freimachen Baufeld (Rodung)	1 FA
5	Oberbodenabtrag	LH 926 C
6	Kanalbau Freispiegel mit DL	LH926 C, 3 FA CAT 323
7	Wiederherstellung Oberflächen	LH 920, 2 FA
8	Kanalbau Druckleitung Zusatzauftrag	CAT 323, 2 FA Terex TC60
9	Dichtheitsprüfung, Kamerabefahrung	NU Fa. Neudel + NU Fa. Kainath
10	Restarbeiten	LH920, 3 FA, Terex TC60

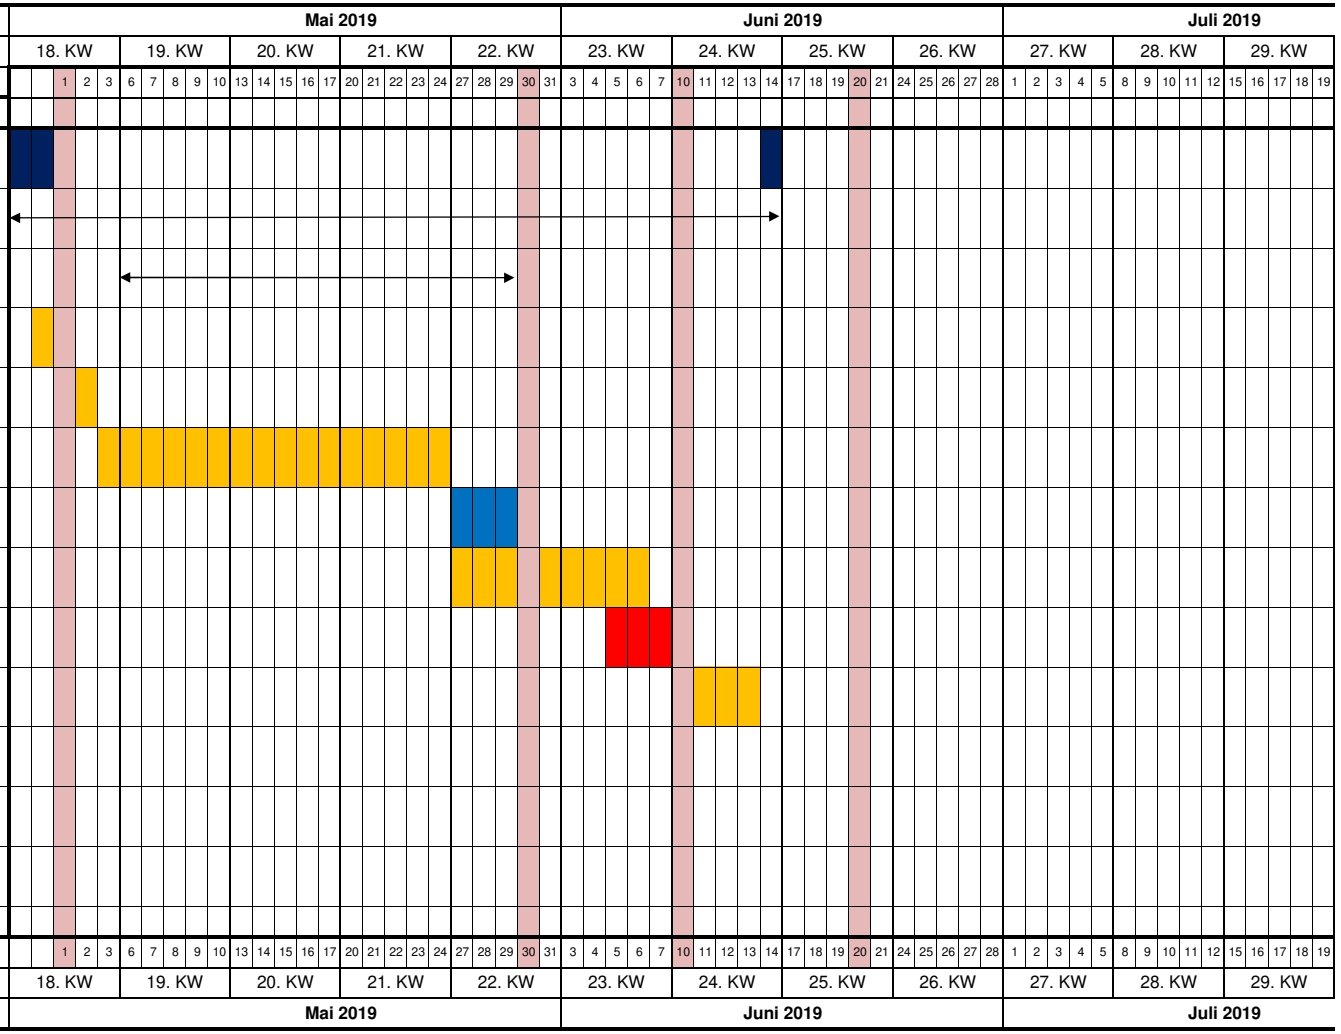

Witterungsbedingte Ausfalltage sind nicht im Bauzeitenplan enthalten und verlängern die Bauzeit!

aufgestellt: 23.04.2019, FB
